

RÉFÉRENCE CHANTIER

QUANTITÉ :  DATE DU ...../...../.....

INFORMATIONS DE LIVRAISON

ENLEVEMENT	ADRESSE PERSONNALISÉE	
	NOM : .....	
	RUE: .....	
	CP:.....	VILLE:.....
	PORTABLE:.....	
LIVRAISON		
COMPTE CLIENT		

**4 CHOIX DE REMPLISSAGE PANNEAUX 60 MM**  
 (Intérieure blanc obligatoire)

**GAMME XOOZ**

POLYGRAIN LISSE

MONORAINURÉE LISSE

**COULEURS**

STANDARD BLANC RAL 9016	AUTRE RAL	Texture lisse : Fine texture uniquement
	FINE TEXTURE	

**8 MANOEUVRE**

**MANUELLE SERRURE EN SAILLIE**

COULEUR POIGNÉE DE LA SERRURE  
NOIRE ALU


**MOTRISÉE PAR L'INSTALLATEUR (FOURNIS PAR VOS SOINS)**

**MOTRISÉE**

MOTEUR SOMMER	MOTEUR SOMFY	MOTEUR LIFTMASTER
Duo VISION Pro+	RTS IO	
OPTION ALURLMINI (POUR UNE FAIBLE RL)	PACK TAHOMA (IO)	LMEVF

L'EXPÉDITION DES PRODUITS COMMANDÉS SERA EFFECTUÉE DANS LES LOCAUX DE L'ACHETEUR. SI LA LIVRAISON ÉTAIT EFFECTUÉE EN TOUT AUTRE LIEU, DES FRAIS DE LIVRAISON SUPPLÉMENTAIRES SERONT FACTURÉS

**1 DIMENSIONS** côtes en mm

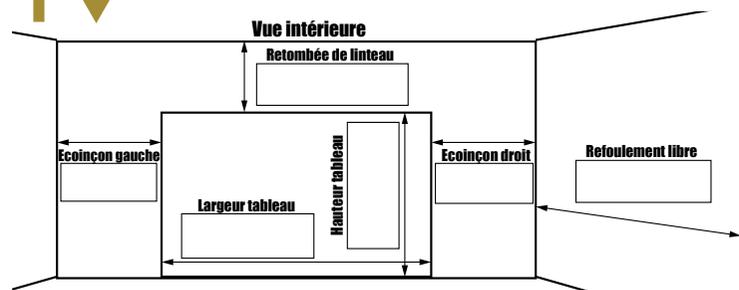

**2 OPTION DE BAIE**

**KIT RENOVATION**

LONGUEUR	QUANTITÉ	TUBE POUR :		
		ÉCOÏÇON GAUCHE	ÉCOÏÇON DROIT	LINTEAU
40x40	X			
50x50	X			
80x40	X			
100x40	X			
120x40	X			
140x40	X			
200x40	X			

DIMENSIONS PORTE APRÈS DÉDUCTION DES TUBES : Lg= x Ht=

**3 CONFIGURATION DE MONTAGE**

POSITIONS DES RESSORTS

À L'AVANT		A L'ARRIÈRE
STANDARD -RL190MM	OPTION - RL 160MM	OPTION - LHR 130 MM
OPTION SURÉLÉVATION DES RAILS VERTICAUX RLMINI 340 MM		
VALEUR DE SURÉLÉVATION :		

**5 HUBLOTS ET INSERTS**

Pour le positionnement faire un schéma en annexe

HUBLOTS		INSERTS	
CODE :		RÉFÉRENCE :	
QUANTITÉ :		POSITION :	
POSITION :			

**6 RENFORT OMEGA Ω**

OBLIGATOIRE POUR PORTE Lg ≥ 5000mm (sans portillon)

GALVANISÉ BLANC

**7 OPTIONS TABLIER/ ROULETTES**

Pour le positionnement faire un schéma en annexe

TÊTE DE BOITE AUX LETTRES BLANC ALU ANODISÉ	ROULETTE SIMPLE ROULETTE DUPLEX*	PRÉÉQUIPÉ * (+10%)
GRILLE DE VENTILATION	*INTERDIT SI Lg > 4500 MM	*INTERDIT SI Lg > 3500 MM

**9 ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES**

SEUIL ALU	EPDM	CORNIÈRE PERFORÉE 3M
CORNIÈRE ALU. 40x40.EP3		SUSPENTE MURS LATÉRAUX
CORNIÈRE ALU. 60x40.EP2		SUSPENTE VERTICALE Lg500
PLAT ALU 40.ep2		CARTER RAILS VERTICAUX
CORNIÈRE RENO	BLANC NOIRE	Qté :

**10 OBSERVATIONS**

FAIRE UN SCHÉMA POUR HUBLOTS, INSERTS, OBSTACLE, COMPTEUR, TÊTE DE BOITE AUX LETTRES, GRILLE DE VENTILATION...
